

フリークライマーズハウス新築工事

地盤補強工事(柱状改良工事)



2012.09.10
地盤補強工事



2012.09.10
掘削



2012.09.10
セメント攪拌中



2012.09.10
打設完了



2012.09.10
打設天端処理完了



2012.09.10
打設天端処理完了

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事



2012.09.11
打設完了確認

地盤補強工事（柱状改良工事）




2012.09.11
打設完了確認



2012.09.12
杭径確認 $\Phi 600$



2012.09.12
杭径確認 $\Phi 600$

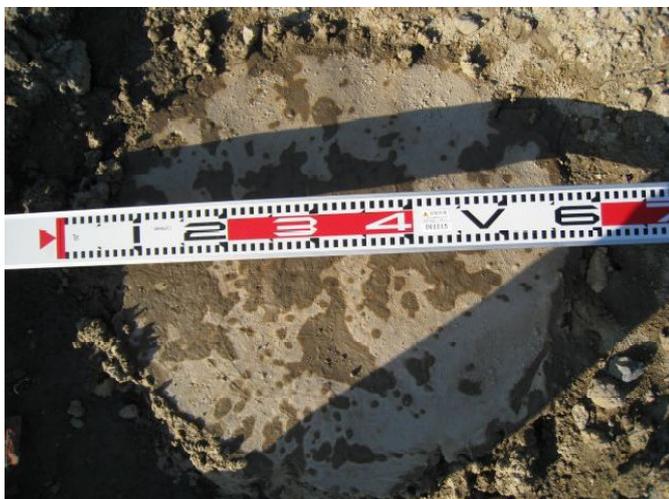

2012.09.12
杭径確認 $\Phi 600$



2012.09.12
杭径確認 $\Phi 600$


吉村紳 一級建築士事務所



2012.09.18
位置出し、丁張り



2012.09.18
位置出し、丁張り

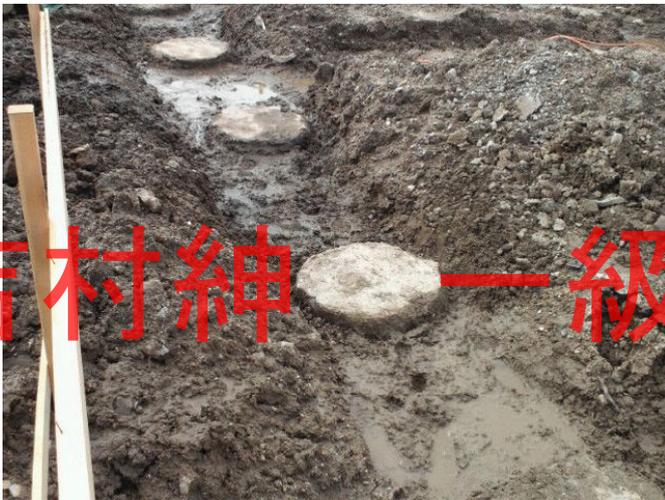

2012.09.18
掘削、杭頭出し



2012.09.18
掘削、杭頭出し



2012.09.18
掘削、杭頭出し



2012.09.18
掘削、杭頭出し


吉村紳 一級建築士事務所



2012.09.24
基礎配筋（書斎部分）



2012.09.24
基礎配筋（LD部分）

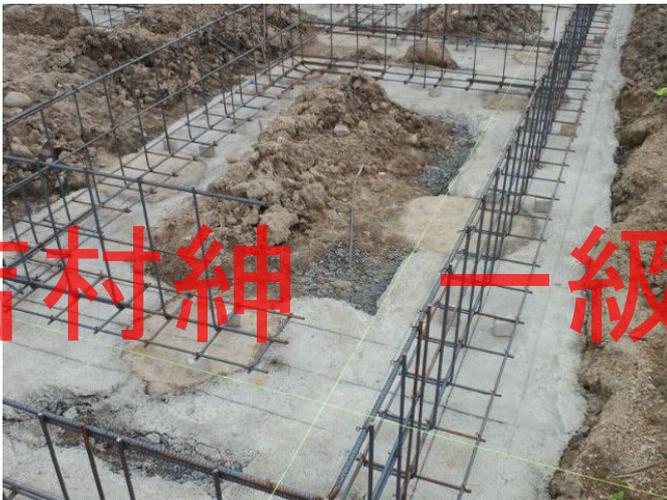

2012.09.24
基礎配筋（階段下部分）



2012.09.25
ベース型枠入れ



2012.09.25
ベース型枠入れ(書斎)



2012.09.25
ベース型枠入れ(LD)

吉村紳 一級建築士事務所




2012.09.25
ベース型枠入れ(階段)



2012.09.25
ベース型枠入れ(トイレ)



2012.09.25
ベース型枠入れ(洗面)

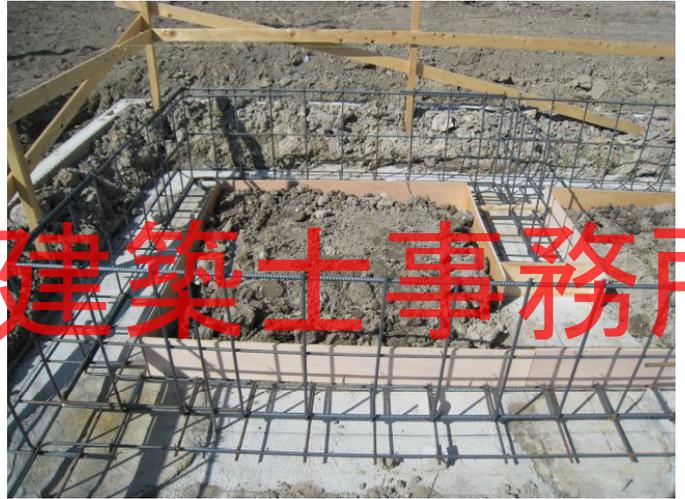

2012.09.25
ベース型枠入れ(浴室)



2012.09.25
ベース型枠入れ(玄関)



2012.09.25
ベース型枠入れ(ポーチ)

吉村紳 一級建築士事務所




2012.09.25
基礎配筋タイプ3



2012.09.25
ポーチ部分補強筋



2012.09.25
基礎配筋人通口補強

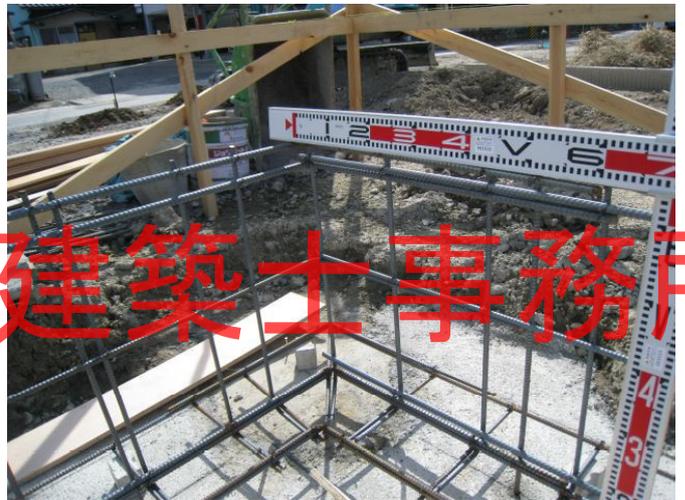

2012.09.25
基礎配筋コーナー補強筋



2012.09.25
基礎配筋タイプ2



2012.09.25
基礎配筋タイプ1


吉村紳 一級建築士事務所



2012.09.26
基礎型枠建込



2012.09.26
基礎型枠建込

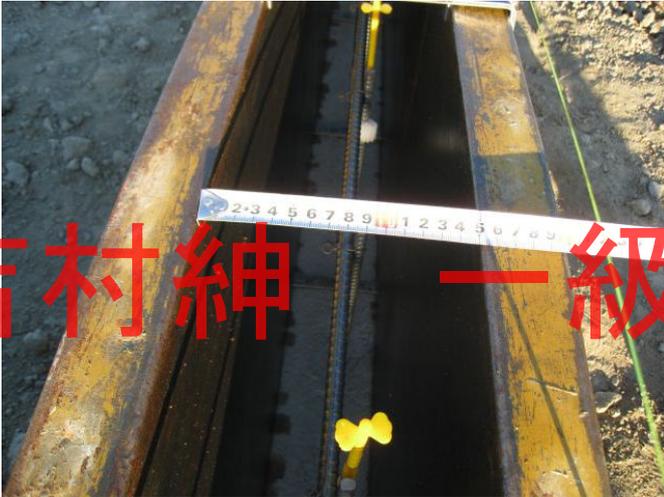

2012.09.26
基礎幅=150mm確認



2012.09.26
ホールダウン用アンカーボルト



2012.09.26
ホールダウン用アンカーボルト



2012.09.26
ホールダウン用アンカーボルト

吉村紳 一級建築士事務所



2012.09.26

ホールダウン用アンカーボルト



2012.09.26

ホールダウン用アンカーボルト



2012.09.29

基礎コンクリート打設完了



2012.09.29

基礎コンクリート打設完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.09.29

基礎コンクリート打設完了



2012.09.29

基礎コンクリート打設完了



2012.09.29

ホールダウン用アンカーボルトM16



2012.09.29

ホールダウン用アンカーボルトM16



2012.09.29

ホールダウン用アンカーボルトM16



2012.09.29

アンカーボルトM12



2012.09.29

アンカーボルトM12



2012.09.29

アンカーボルトM12

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.02
基礎出来形確認基礎巾=150mm



2012.10.02
基礎出来形確認基礎立上り



2012.10.02
基礎完了(書斎)



2012.10.02
基礎完了(ポーチ)



2012.10.02
基礎完了(書斎)



2012.10.02
基礎完了(人通口)

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.02
防湿コンクリート下碎石敷きt100



2012.10.02
防湿コンクリート下碎石敷きt100



2012.10.02
防湿コンクリート下碎石敷きt100



2012.10.03
排水部分



2012.10.03
排水部分



2012.10.03
給水部分

吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き

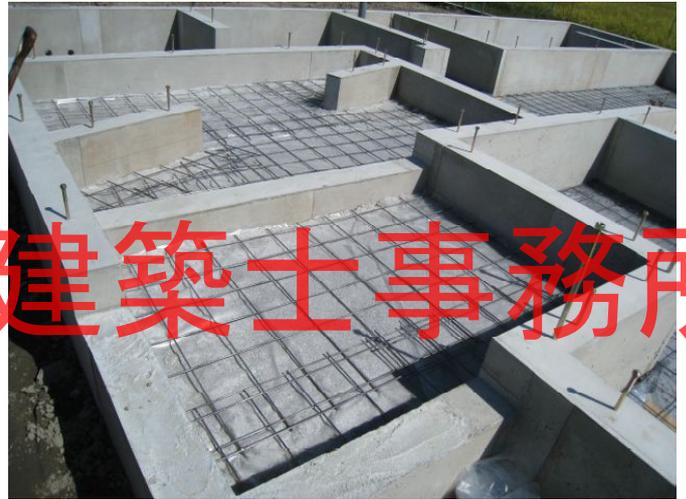

2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.03
防湿フィルムの上ワイヤーメッシュ敷き



2012.10.04
防湿コンクリート打設完了



2012.10.04
防湿コンクリート打設完了



2012.10.04
防湿コンクリート打設完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.05
土台：ベイヒバ120×120



2012.10.05
土台：ベイヒバ120×120



2012.10.05
土台伏せ



2012.10.05
土台伏せ




2012.10.05
土台伏せ




2012.10.05
土台伏せ

吉村紳 一級建築士事務所

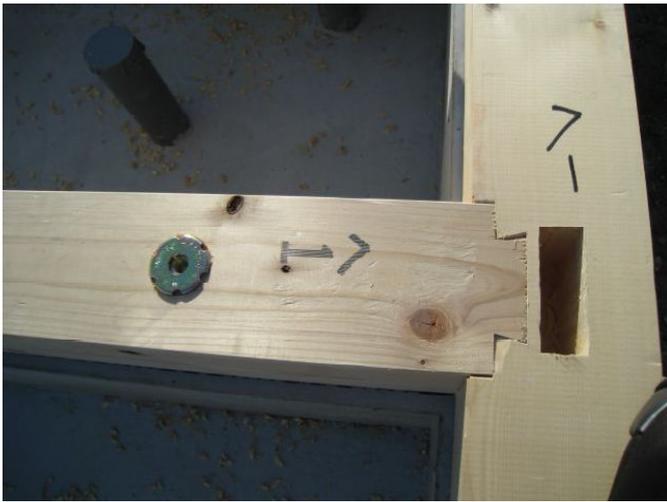

2012.10.05
土台継手位置確認

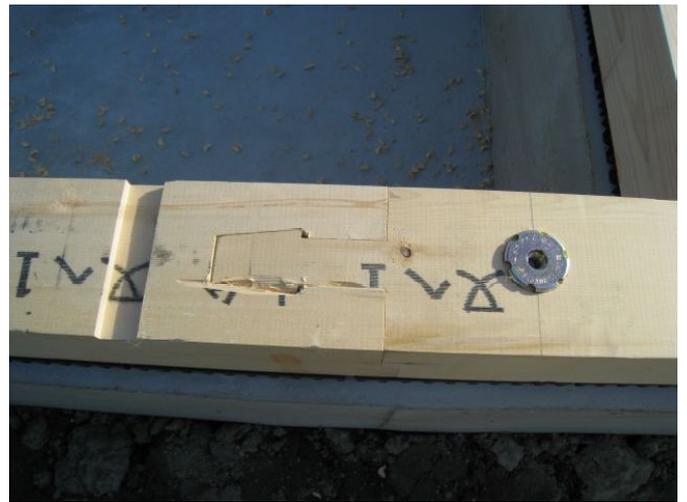

2012.10.05
土台継手位置確認



2012.10.05
土台継手位置確認



2012.10.05
土台継手位置確認


吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.09
外部足場



2012.10.09
外部足場

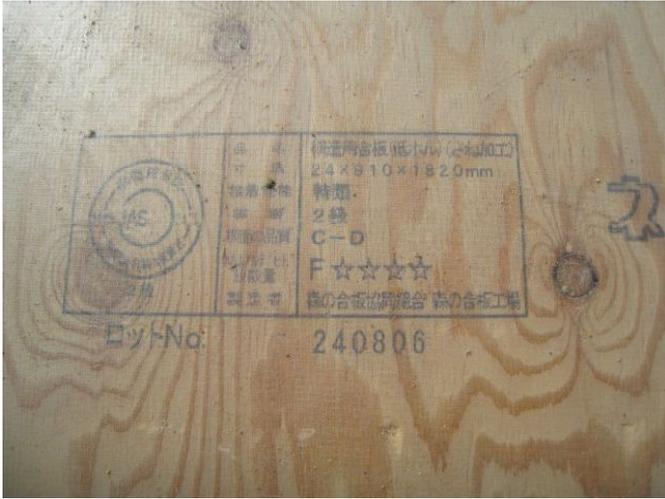

2012.10.09
床下地用構造用合板 t 24



2012.10.10
管柱：桧105×105



2012.10.10
通し柱：桧135×135



2012.10.10
隅柱：桧120×120

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.10
建て方




2012.10.10
建て方




2012.10.10
梁材：米松



2012.10.10
1階柱及び2階床梁建込

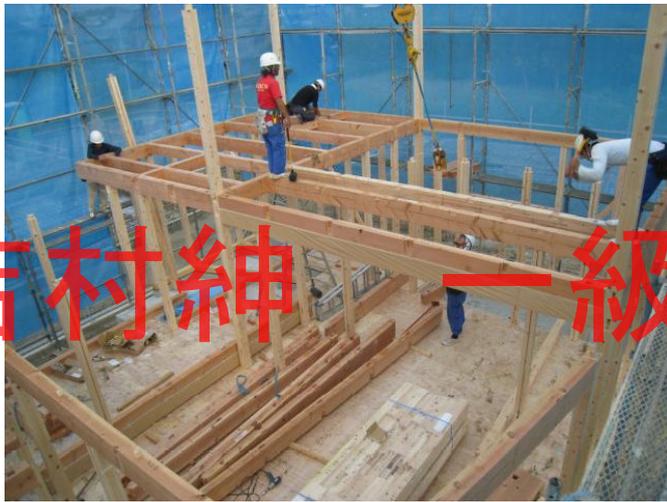

2012.10.10
1階柱及び2階床梁建込

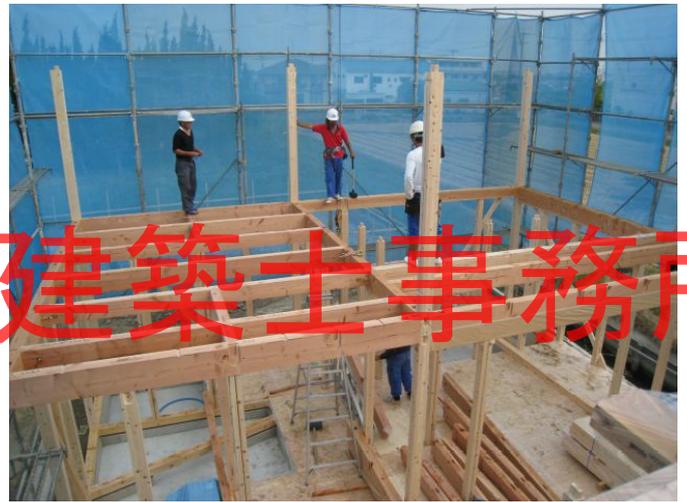

2012.10.10
1階柱及び2階床梁建込



2012.10.10
1階柱及び2階床梁建込



2012.10.10
通し柱+胴差取合い

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.10
通し柱+胴差



2012.10.10
通し柱+胴差



2012.10.10
持ち出し梁（バルコニー）



2012.10.10
持ち出し梁（バルコニー）



2012.10.10
床下地構造用合板 t 24張り



2012.10.10
N75@150固定（床倍率3.0倍）

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.10
N75@150固定（床倍率3.0倍）



2012.10.10
N75@150固定（床倍率3.0倍）



2012.10.10
持ち出し梁（ポーチ庇）



2012.10.10
持ち出し梁（バルコニー）



2012.10.10
持ち出し梁



2012.10.10
2階～母屋通し柱

吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.10
階段室



2012.10.10
母屋



2012.10.10
母屋

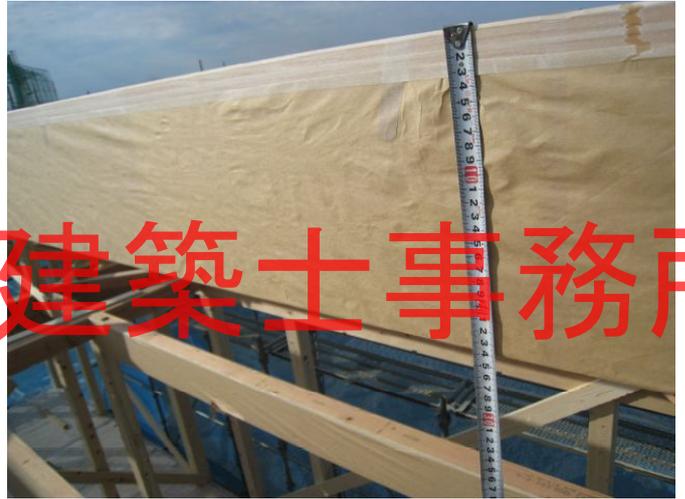

2012.10.10
母屋梁



2012.10.10
母屋



2012.10.10
柱+小屋梁+小屋束取合い


吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.10
小屋束、母屋建込



2012.10.10
小屋束、母屋建込

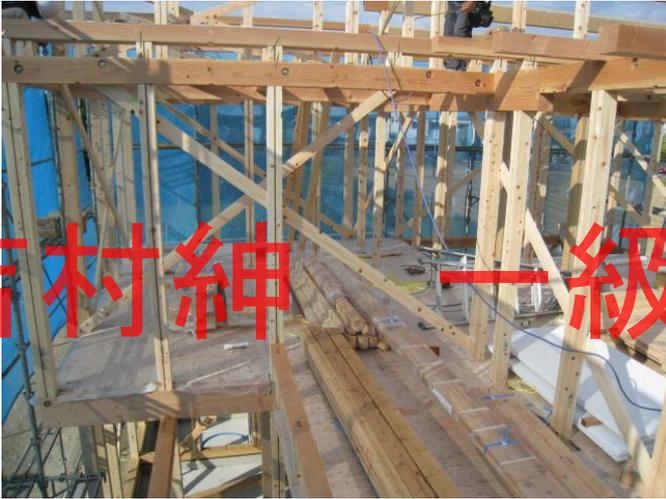

2012.10.10
2階寝室部分

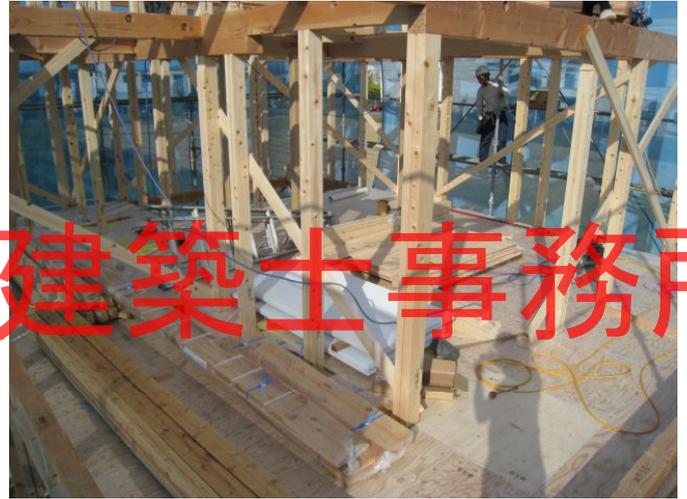

2012.10.10
2階子供室部分



2012.10.10
建て方1日目



2012.10.10
建て方1日目

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.10
野地板N50@150固定



2012.10.10
野地板N50@150固定



2012.10.10
野地板：構造用合板 t 12



2012.10.10
野地板固定釘：N50



2012.10.10
野地板張り



2012.10.10
鼻隠し：スギ t 30



2012.10.11
母屋+垂木ひねり金物固定



2012.10.11
母屋+垂木ひねり金物固定



2012.10.11
屋根防音・断熱用シーリングボード t 12.5



2012.10.11
屋根防音・断熱用シーリングボード t 12.5

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.11
バルコニー防音・断熱用シーリングボード t 12.5



2012.10.11
アスファルトルーフィング 立上り=250以上



2012.10.11
屋根防水層アスファルトルーフィング張り



2012.10.11
屋根防水層アスファルトルーフィング張り



2012.10.11
屋根防水層アスファルトルーフィング張り



2012.10.11
屋根防水層アスファルトルーフィング張り

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.11
母屋+垂木ひねり金物固定




2012.10.11
ロフト部分



2012.10.11
ロフト部分



2012.10.11
ロフト部分

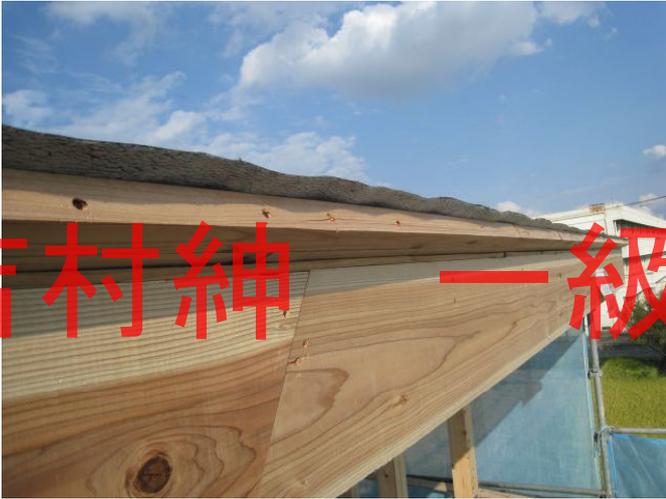

2012.10.11
鼻隠し部分



2012.10.11
鼻隠し部分



2012.10.11
屋根防水工事完了



2012.10.11
屋根防水工事完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13 玄関西面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 浴室西面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 浴室北面
片筋交い : 45×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13 浴室北面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 浴室南面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 浴室南面
片筋交い : 45×90



2012.10.22 洗面室北面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.22 トイレ西面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.22 トイレ西面
片筋交い : 45 × 90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.22 階段室西面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.22 階段室西面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.22 階段室北面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.22 階段室北面
片筋交い : 45×90



2012.10.22 階段室東面
片筋交い : 45×90



2012.10.22 階段室東面
片筋交い : 45×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.22 キッチン北面
両筋交い : 45×90



2012.10.22 キッチン北面
片筋交い : 45×90




2012.10.22 キッチン東面
両筋交い : 45×90



2012.10.22 レゾフト前
両筋交い：45×90



2012.10.22 LD東面
両筋交い：45×90

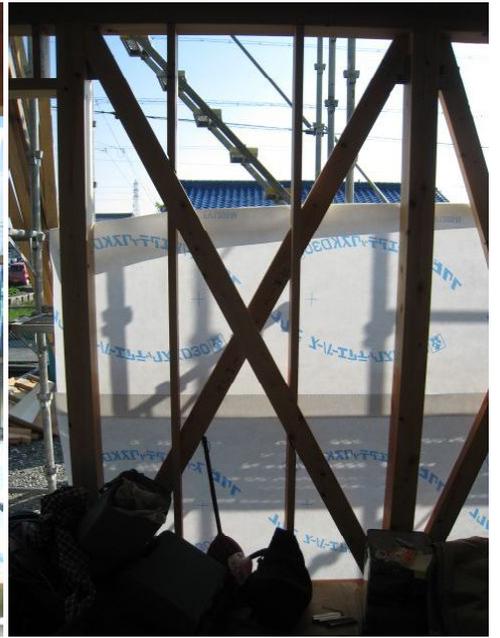

2012.10.22 LD南面
両筋交い：45×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.22 LD南面
両筋交い：45×90



2012.10.22 書斎東面
両筋交い：45×90



2012.10.22 書斎南面
両筋交い：45×90



2012.10.22 書斎西面
片筋交い : 45×90



2012.10.22 書斎西面
両筋交い : 45×90



2012.10.22 書斎西面
片筋交い : 45×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.22 書斎北面
両筋交い : 45×90



2012.10.22 キッチン物入北面
両筋交い : 45×90



2012.10.22 キッチン物入西面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 寝室南面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 寝室南面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 寝室西面
両筋交い : 45×90

吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.13 WIC西面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 WIC西面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 WIC北面
片筋交い : 45×90

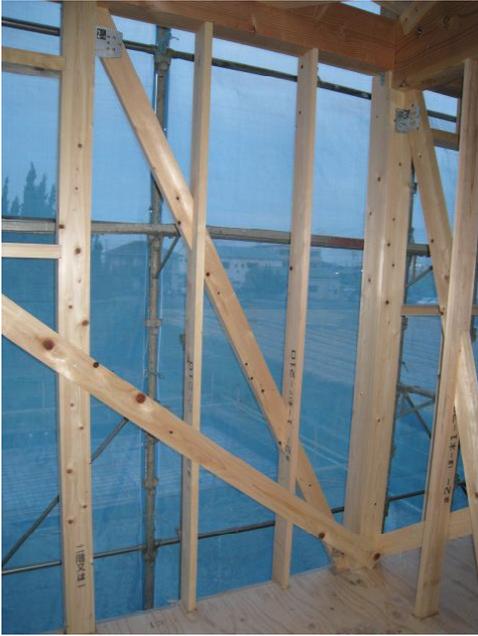

2012.10.13 WIC北面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.13 階段室2階北面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.13 階段室2階北面
片筋交い : 45 × 90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13 階段室2階東面
両筋交い : 45 × 90



2012.10.13 階段室2階東面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.13 子供室東面
片筋交い : 45 × 90



2012.10.13 子供室東面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 子供室東面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 子供室南面
両筋交い : 45×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13 子供室西面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 子供室西面
両筋交い : 45×90



2012.10.13 WIC東面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 WIC東面
片筋交い : 45×90



2012.10.13 子供室北面
両筋交い : 90×90



2012.10.13 子供室北面
両筋交い : 90×90

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13
柱脚ホルダウン金物



2012.10.13
柱脚ホルダウン金物



2012.10.13
柱脚ホルダウン金物



2012.10.13
柱頭ホルダー金物



2012.10.13
柱脚ホルダー金物



2012.10.13
柱頭ホルダー金物

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13
柱脚ホルダー金物



2012.10.13
柱頭ホルダー金物



2012.10.13
柱脚ホルダー金物



2012.10.13
柱頭ホルダ`ン金物



2012.10.13
小屋束柱頭金物固定



2012.10.13
柱脚ホルダ`ン金物

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13
柱頭ホルダ`ン金物



2012.10.13
柱脚金物固定



2012.10.13
柱頭金物固定



2012.10.13
柱脚金物固定



2012.10.13
柱頭金物固定



2012.10.13
小屋束柱頭金物固定

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.15 小屋裏補強
片筋交い：45×90



2012.10.15 小屋裏補強
片筋交い：45×90



2012.10.15 小屋裏補強
片筋交い：45×90



2012.10.15 小屋裏補強
片筋交い：45×90



2012.10.15 小屋裏補強
片筋交い：45×90



2012.10.15
小屋束柱頭金物固定


吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.13
小屋束柱頭金物固定



2012.10.13
梁継手部分補強金物

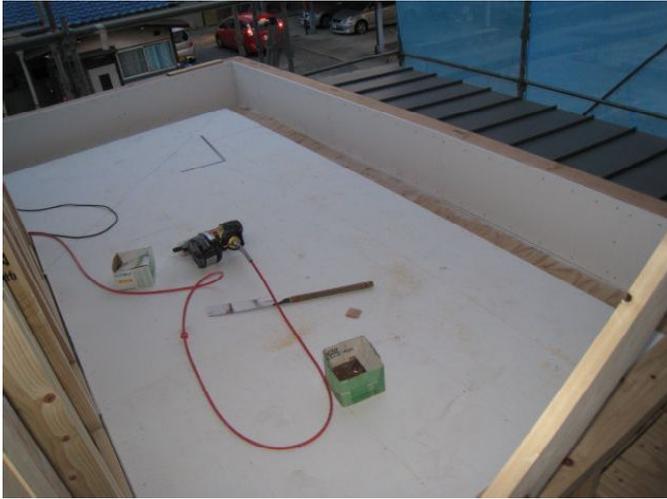


2012.10.13

バルコニー ケイカル板 t 12



2012.10.13

屋根ガルバリウム鋼板葺き

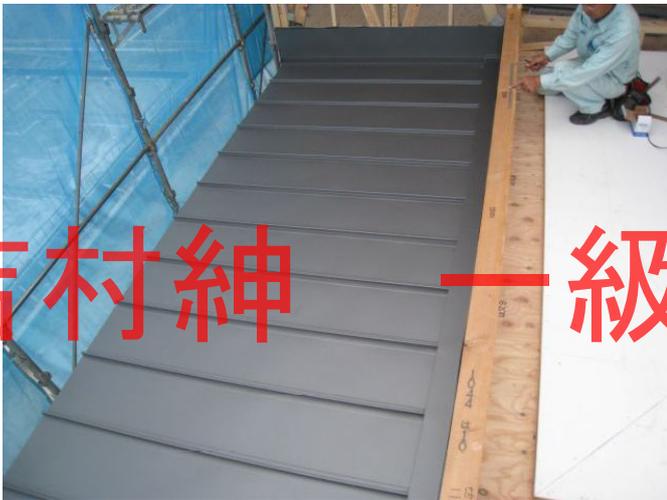


2012.10.13

屋根ガルバリウム鋼板葺き




2012.10.13

屋根ガルバリウム鋼板葺き

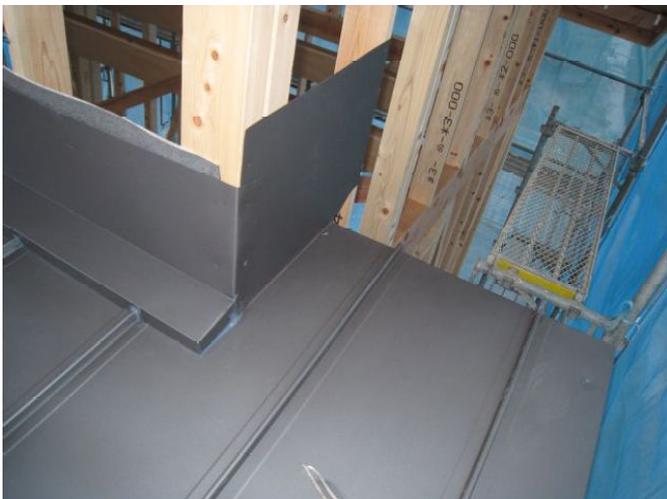

2012.10.13


屋根立上りコーナー部分

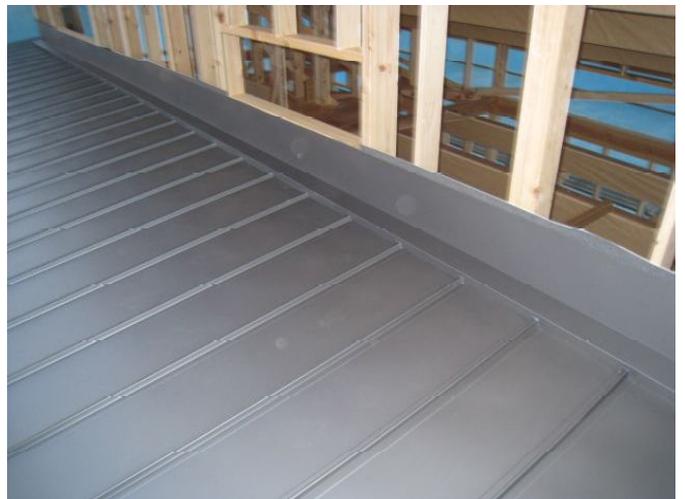

2012.10.13

屋根立上り部分


吉村紳 一級建築士事務所

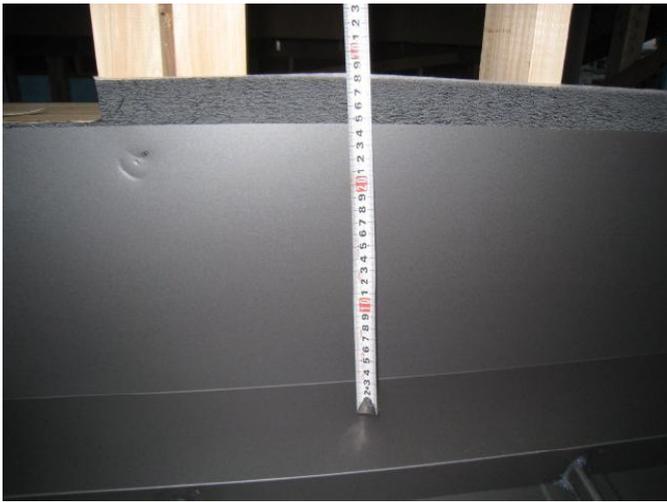


2012.10.13
水切り板金立上り = 250mm以上



2012.10.13
バルコニー ケイカル板 t 12

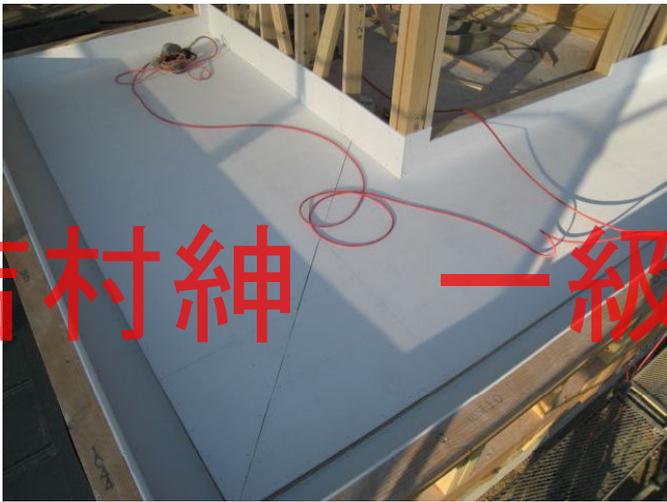

2012.10.13
バルコニー ケイカル板 t 12

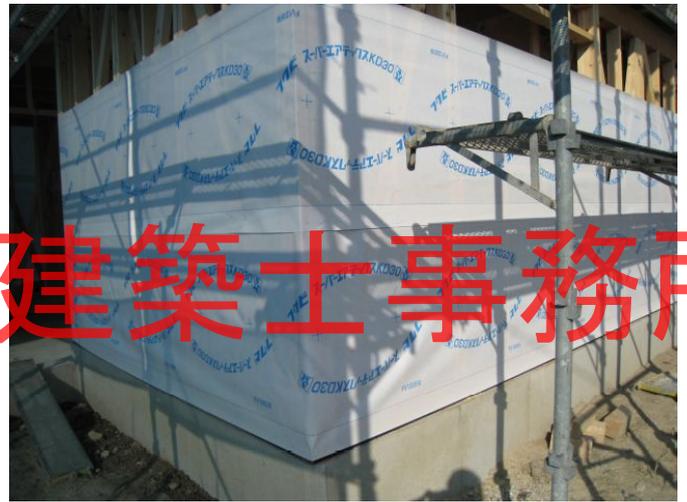

2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.22
軒裏換気金物取付



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
軒裏換気金物取付



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り


吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り

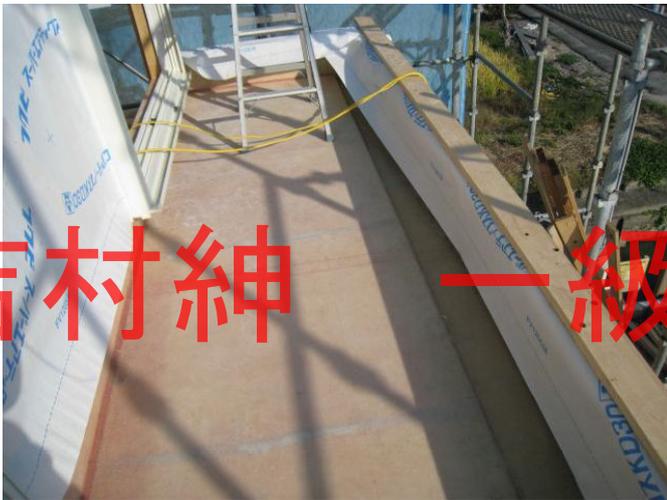

2012.10.22 バルコニー
FRP防水施工

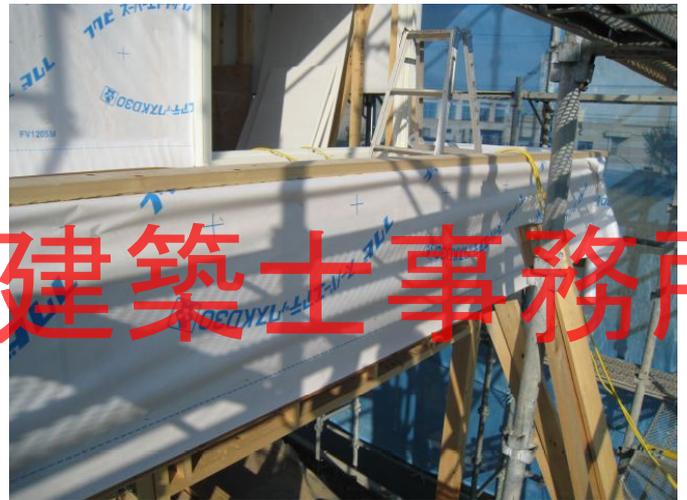

2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り


吉村紳 一級建築士事務所




2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り

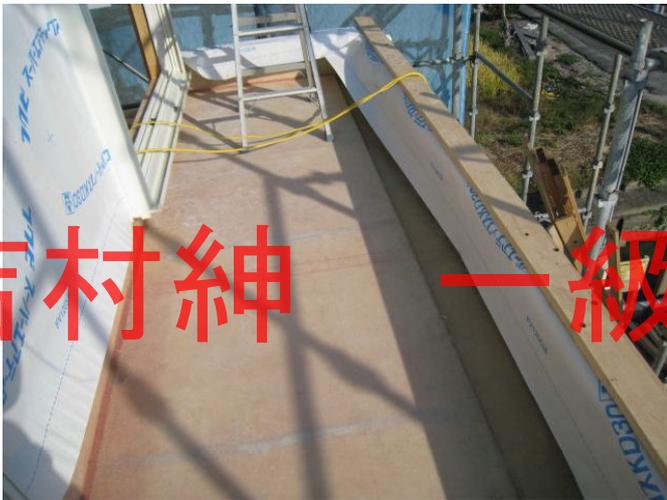

2012.10.22 バルコニー
FRP防水施工

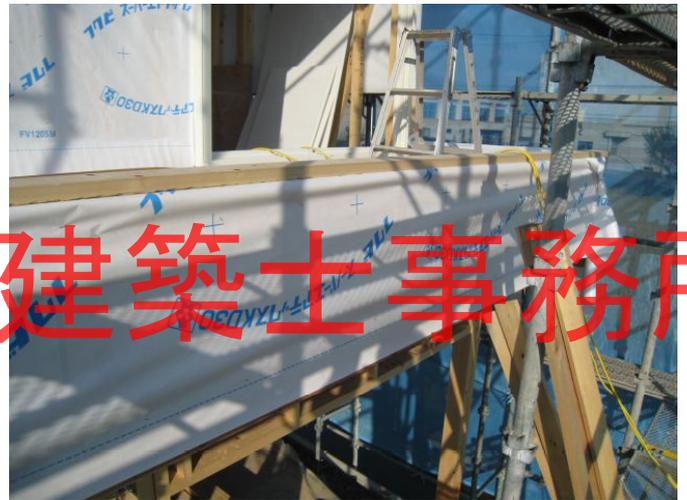

2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り



2012.10.22
外壁透湿防水シート張り

吉村紳 一級建築士事務所



2012.10.30
外壁通気胴縁取付



2012.10.30
軒先水切り板金取付



2012.10.30
外壁通気胴縁取付



2012.10.30
外壁 木摺 t 12取付



2012.10.30
外壁 木摺 t 12取付



2012.10.30
外壁 木摺 t 12取付

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

外装工事



2012.11.01

外壁木張り下地ダライト



2012.11.01

外壁木張り下地ダライト



2012.11.01

外壁木摺り取付



2012.11.01

外壁木摺り取付



2012.11.02

外壁木下地防水シート張り



2012.11.02

外壁木摺り取付

吉村紳 一級建築士事務所



2012.11.02
外壁木摺取付



2012.11.02
外壁木摺取付



2012.11.02
外壁木摺取付



2012.11.02
外壁通気金物取付



2012.11.02
外壁通気金物取付



2012.11.02
外壁通気金物取付

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

外装工事



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り



2012.11.09 外壁そとん壁下地
防水シート張り

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事


外装工事




2012.11.12 外壁そとん壁下地
メタルラス張り



2012.11.12 外壁そとん壁下地
メタルラス張り

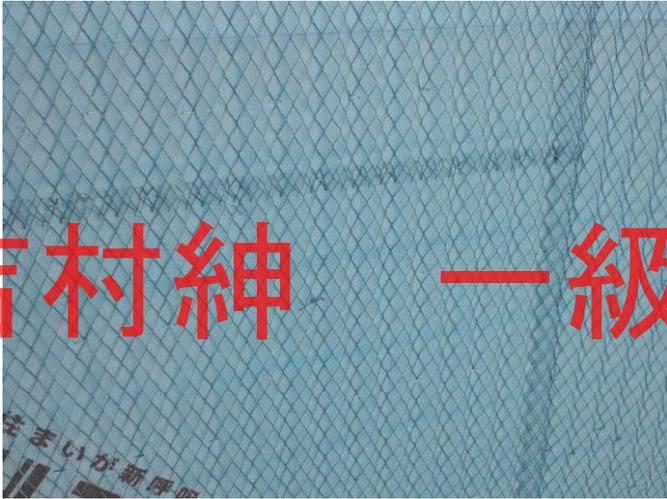

2012.11.12 外壁そとん壁下地
メタルラス張り

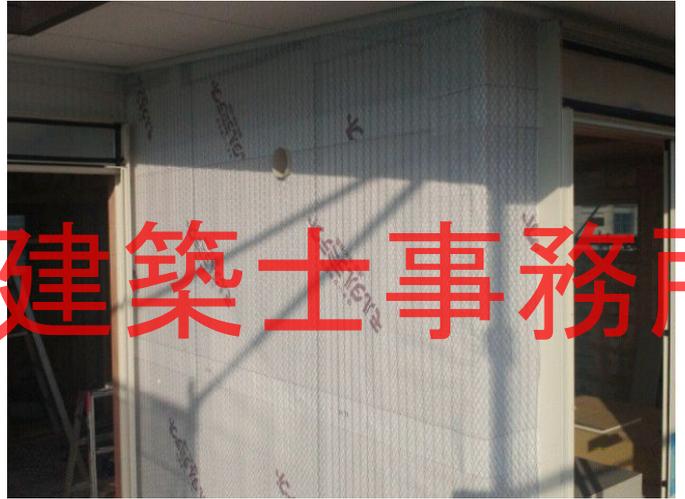

2012.11.12 外壁そとん壁下地
メタルラス張り

吉村紳 一級建築士事務所



2012.11.14 外壁そとん壁下地
メタルラス張り完了




2012.11.14 外壁そとん壁下地
メタルラス張り完了



2012.11.19 外壁そとん壁
下塗り



2012.11.19 外壁そとん壁
下塗り

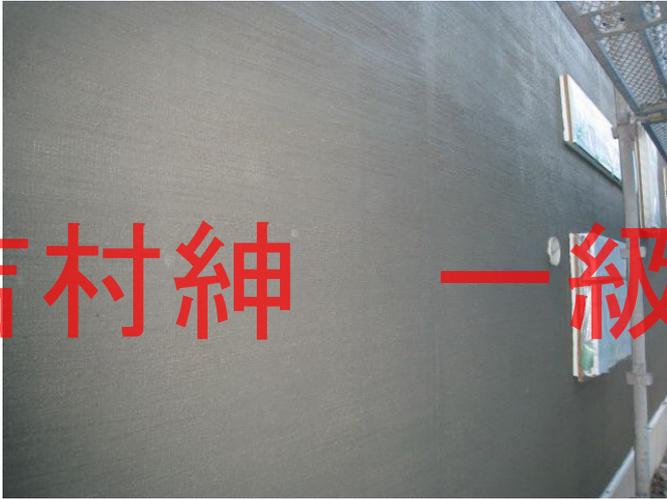

2012.11.19 外壁そとん壁
下塗り



2012.11.19 外壁そとん壁
ファイバーメッシュシート塗り込み



2012.11.19 外壁そとん壁
ファイバーメッシュシート



2012.11.19 外壁そとん壁
下塗り目荒らし（刷毛引き）

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

外装工事



2012.11.21 外壁そとん壁
下塗り



2012.11.21 外壁そとん壁
下塗り




2012.11.21 外壁そとん壁
下塗り



2012.11.21 外壁そとん壁
下塗り



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

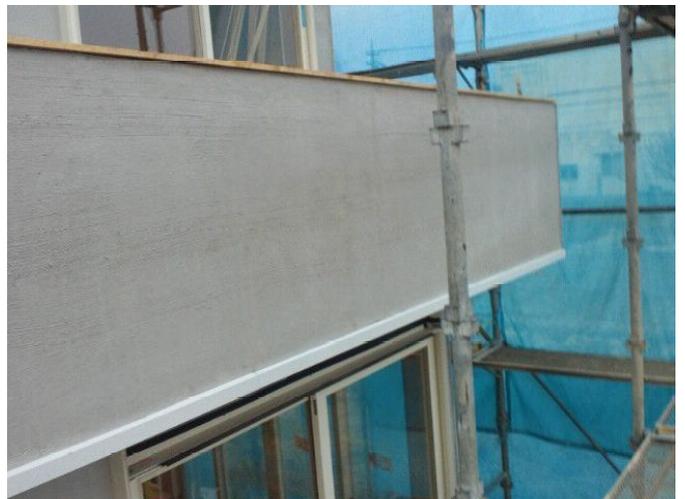

2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所




2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

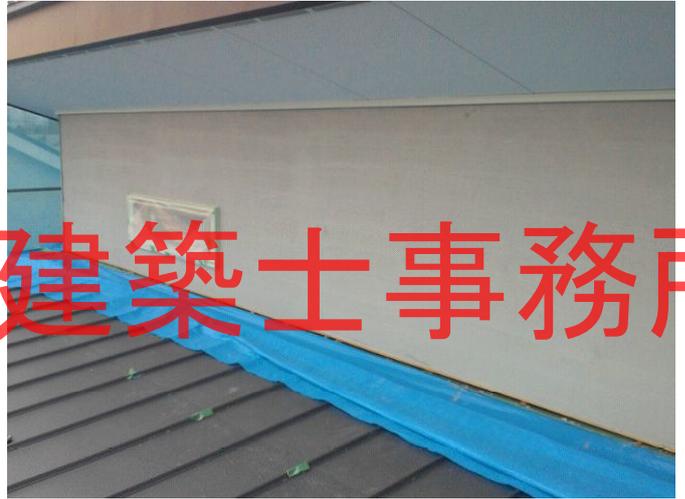

2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了



2012.12.05 外壁そとん壁
下塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.17 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.17 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り




2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

外装工事

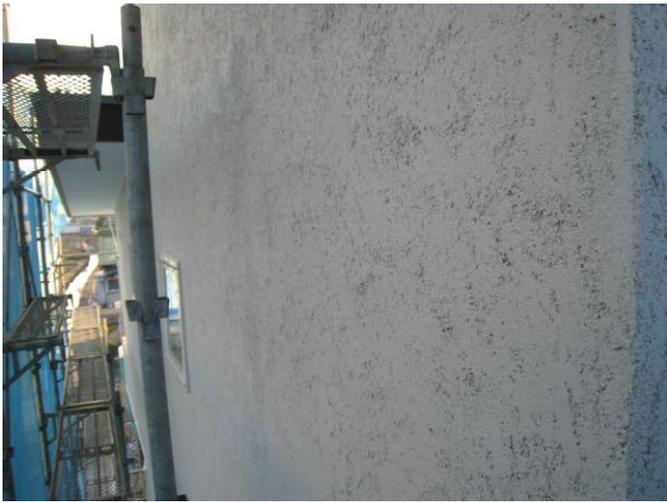

2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り



2012.12.20 外壁そとん壁
上塗り

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了




2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了

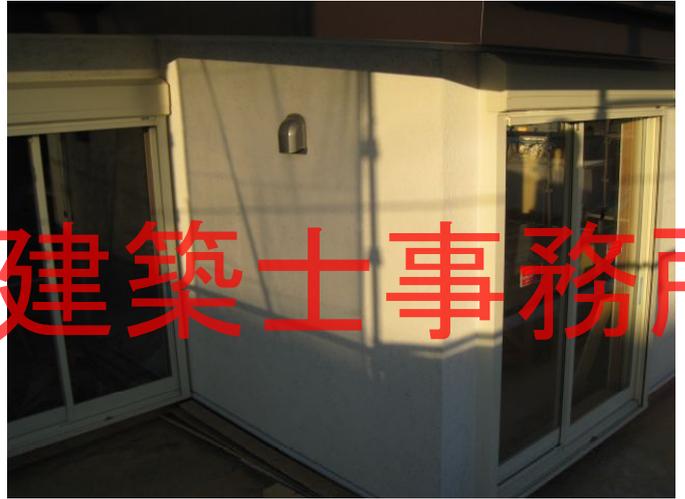

2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了

吉村紳 一級建築士事務所



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了

フリークライマーズハウス新築工事

外装工事



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.26 外壁そとん壁
上塗り完了



2012.12.27
外部足場解体



2012.12.27
外部足場解体



2013.01.18
ベランダ手摺取付 外装工事完了



2013.01.18
ベランダ手摺取付 外装工事完了

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.10.25
天井下地組



2012.10.25
天井下地組



2012.10.25
天井・壁下地組



2012.10.25
天井下地組



2012.10.25
天井下地組



2012.10.25
浴室部分基礎断熱

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.10.25
浴室廻り石膏ボード張り（防火構造）



2012.10.25 階段下収納
基礎断熱施工



2012.10.25 階段下収納
基礎断熱施工



2012.10.30
小屋組部分壁下地



2012.10.30
ロフト部分壁・天井下地組



2012.10.30
ロフト部分壁・天井下地組

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.10.30 ロフト
天井下地組



2012.10.30 ロフト
天井下地組



2012.10.30 1階 書斎
天井・壁下地組



2012.10.30 1階 ホール
天井・壁下地組



2012.10.30 1階 LD
天井・壁下地組



2012.10.30 1階 LD
天井・壁下地組

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.11.09 キッチン
天井羽目板張り



2012.11.09 階段室
壁断熱材グラスウール16K t=100mm充填



2012.11.09 2階子供室
壁断熱材グラスウール16K t=100mm充填



2012.1.09 1階LD 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 1階書斎 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.11.09 2階子供室
壁断熱材グラスウール16K t=100mm充填

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.11.09 書斎 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm充填



2012.11.09 書斎 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 1階LD 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 1階LD 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm



2012.1.09 ロフト 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 ロフト 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.1.09 ロフト 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 2階寝室 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm



2012.1.09 2階小屋裏 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm



2012.1.09 階段室 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm



2012.1.09 子供室 壁断熱材
グラスウール16K t=100mm



2012.1.09 子供室 屋根断熱材
高性能グラスウール16K t=175mm

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.11.12 子供室 天井
プラスターボード t = 9.5mm



2012.11.12 子供室 天井
プラスターボード t = 9.5mm



2012.11.12 子供室 天井
プラスターボード t = 9.5mm



2012.11.12 寝室 天井
プラスターボード t = 9.5mm



2012.11.12 子供室
エアコン取付下地



2012.11.12 寝室
エアコン取付下地

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.11.12 LD
エアコン取付下地

2012.11.12 書斎
エアコン取付下地



吉村紳 一級建築士事務所

2012.11.12 子供室 壁
プラスターボード t = 12.5mm

2012.11.12 子供室 壁
プラスターボード t = 12.5mm



2012.11.17
階段取付

2012.11.17
階段取付

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2012.11.17
階段手摺下地



2012.12.26 キッチン
壁 プラスターボード t=12.5mm



2013.01.07 寝室 壁
下地処理



2013.01.07 寝室 壁
下地処理



2013.01.07 子供室 壁
下地処理



2013.01.07 子供室 壁
下地処理

吉村紳 一級建築士事務所

フリークライマーズハウス新築工事

内装工事



2013.01.07 子供室 壁
下地処理



2013.01.07 LD 壁
下地処理



2013.01.07 LD 天井
下地処理



2013.01.07 LD 壁
下地処理

吉村紳 一級建築士事務所



2013.01.07 階段室 壁
構造用合板t=24mm張り



2013.01.07 階段室 壁
構造用合板t=24mm張り



2013.01.10 階段室 壁
構造用合板張り 完了



2013.01.10 階段室 壁
構造用合板張り 完了



2013.01.18 ロフト
壁・天井加工貼完了



2013.01.18 ロフト
壁・天井加工貼完了



2013.01.18 2階廊下・階段室
壁・天井加工貼完了



2013.01.18 階段室
壁加工貼完了

吉村紳 一級建築士事務所



2013.01.10 階段室 壁
構造用合板張り 完了




2013.01.10 階段室 壁
構造用合板張り 完了



2013.01.18 書斎
中霧島壁塗り



2013.01.18 書斎
中霧島壁塗り

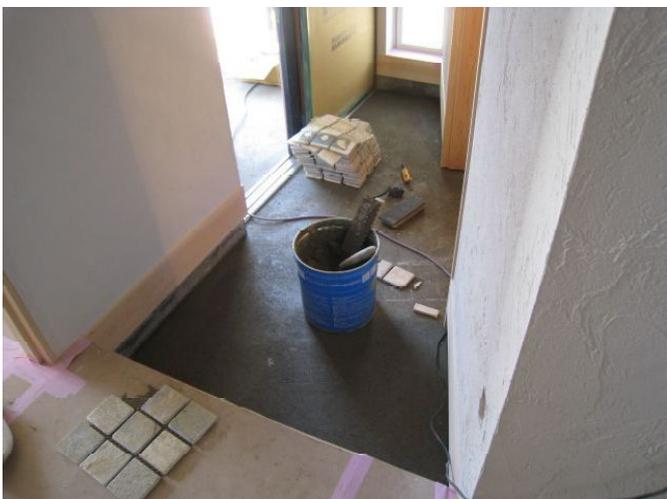

2013.01.18 玄関
タイル下地調整



2013.01.23
シックハウス対策用換気扇取付

吉村紳 一級建築士事務所
